


Construction du plancher, deux murs, contreventement, pare vapeur, pare pluie






Cliquez ici pour taper du texte. débit en série et taillage d'éléments structuraux d'un banc de scie radiale.

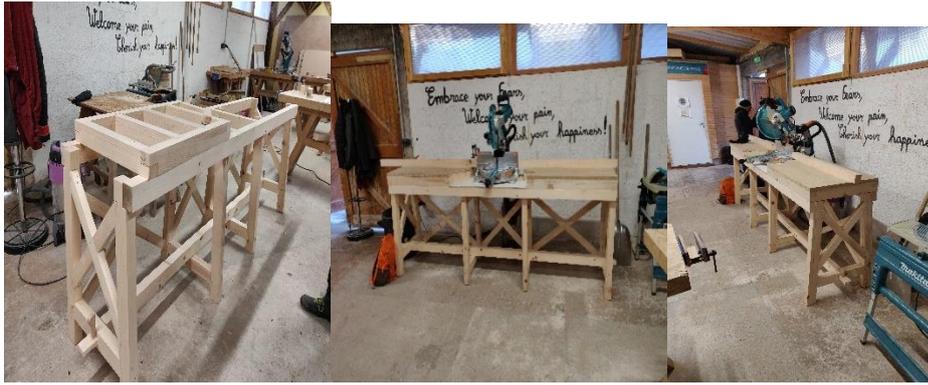

Construction de murs d'ossature en bois massif, lamellé/collé, et poutre en I, contreventé, levé, ancré, puis isolé.

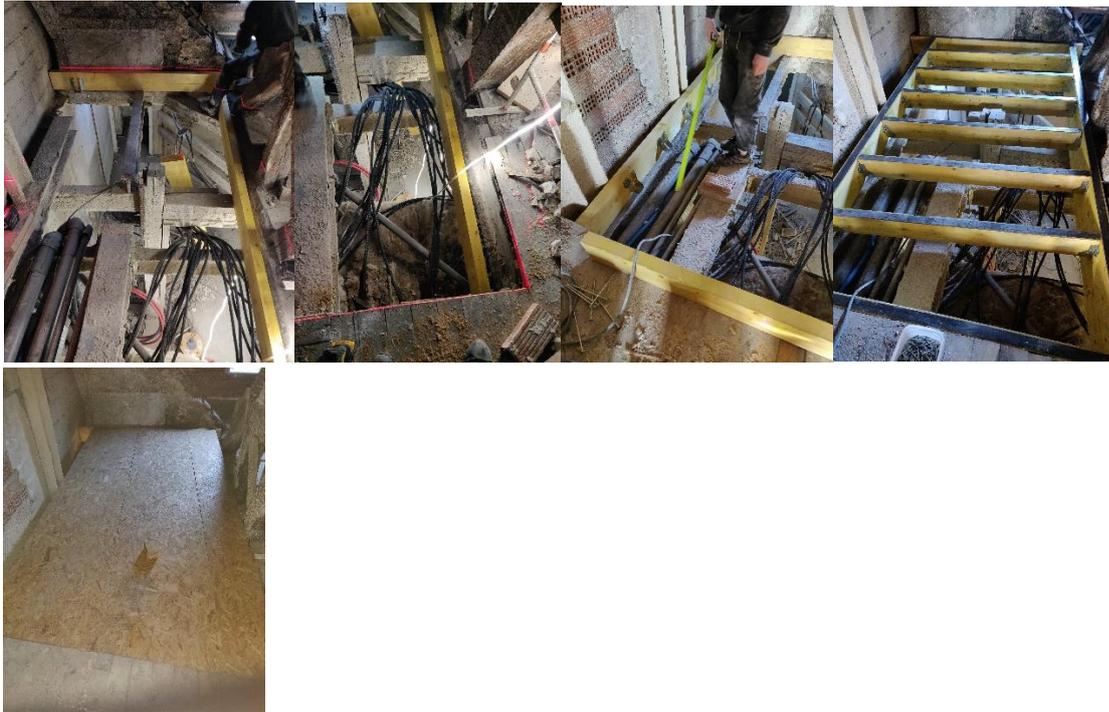

Réalisation d'un solivage de plancher, par ancrage de muralliere et connecteur en u, pose d'une dalle de plancher.




**5. Informations complémentaires (facultatif)**



Travail de couverture, sur pan de toit, pose de lattes et tuiles diverses.



Pose de latte et ouverture d'une trémie accueillant une fenêtre de toit velux et ses abergements.

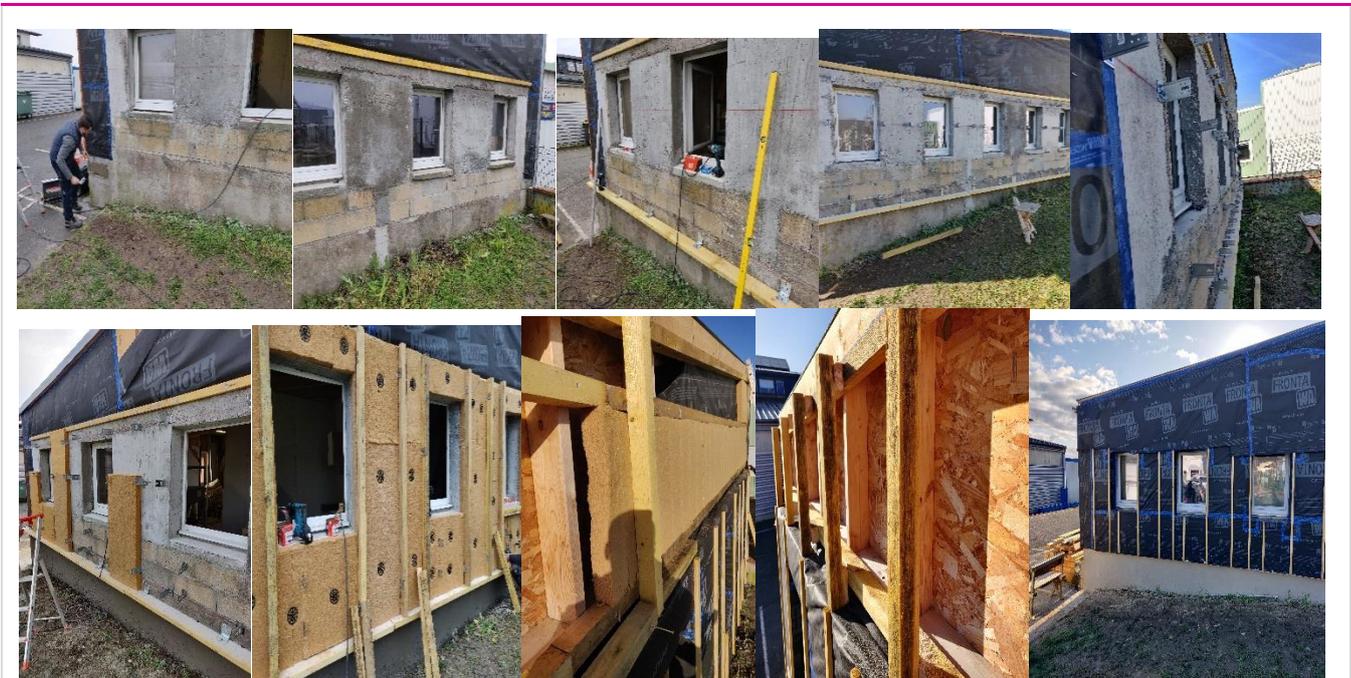



réalisation d'une ossature en façade pour insérer l'isolation bio sourcé en laine de bois, pose du pare pluie et latte de ventilation, débit et pose des lattes support du bardage décor.



Construction d'angle de murs liaison en lisse basse, pare pluie, lattage et bardage, traitement de la baie de porte.



Montage, implantation, levage et ancrage d'un rack a bois.



Débit et montage d'ossature de murs d'angles

avec acrotères, fabrication des murs pour levage et ancrage via lisse d'ancrage et gougeons, liaisons des murs d'angles en lisse basse et lisse haute, pose du contreventement, fixation des murailles, solives et dalle de plancher, pose du pare pluie, lattes et bardage en douglas.
